

宮前公園周辺地域等における公共施設の 順次更新に関する説明会

平成 28 年 7 月 27 日 (水)
19 時 30 分 ~ 20 時 30 分
荒川区立尾久八幡中学校 1 階 武道場


説明会次第

- 1 公共施設の順次更新について (総務企画課)
- 2 宮前公園の先行整備について (道路公園課)
- 3 質疑応答

【配付資料】

- <別紙 1 > 宮前公園周辺地域の公共施設更新のイメージ (案)
- <別紙 2 > 宮前公園周辺地域の地図
- <別紙 3 > (仮称) 宮前公園先行整備工事 工事説明資料
- <別紙 4 > 担当部署連絡先一覧

宮前公園周辺地域の公共施設更新イメージ（案）

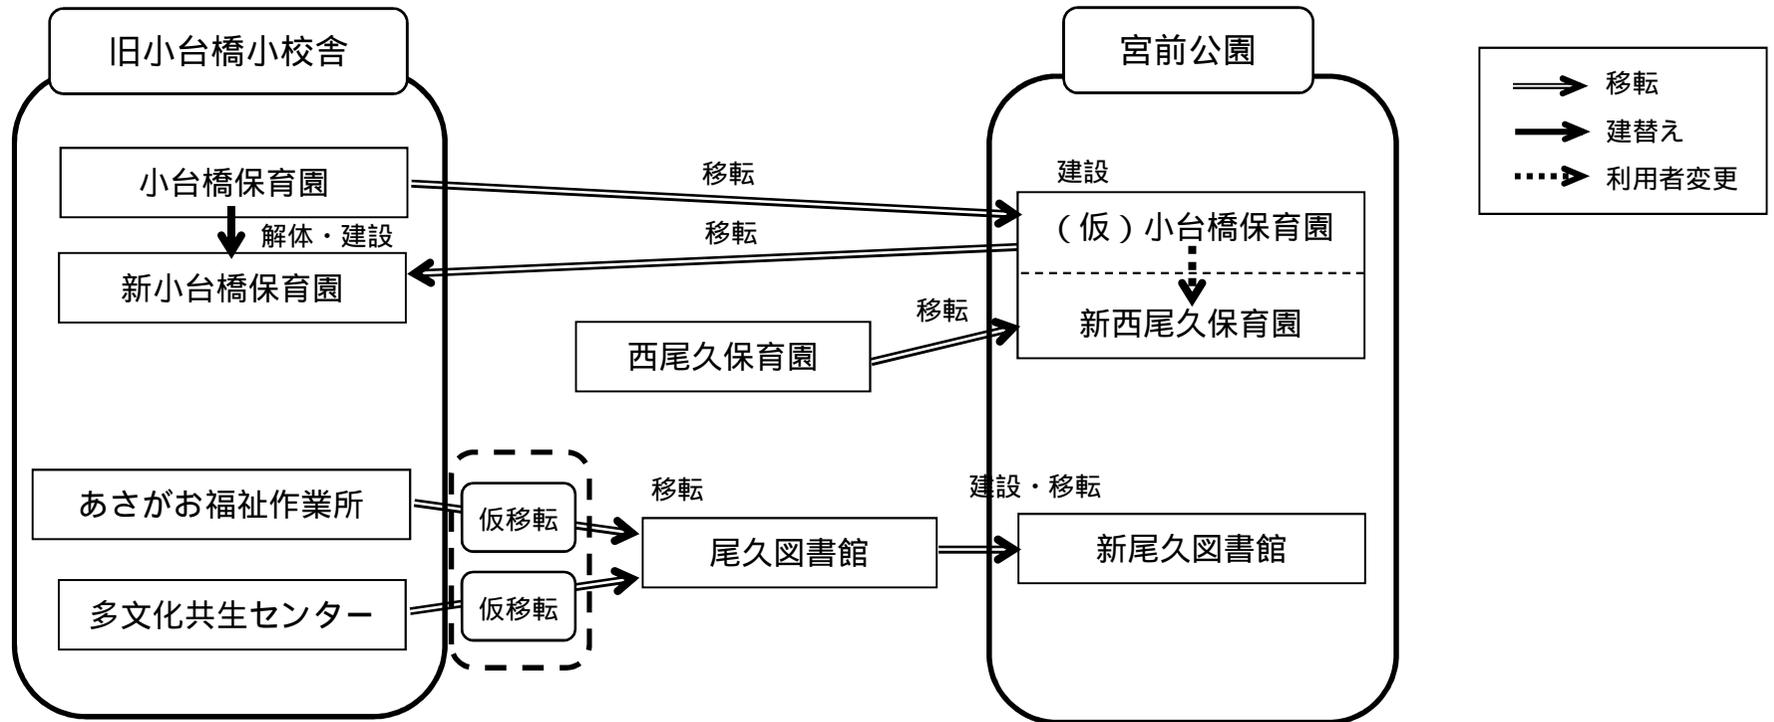

【公共施設の更新手順】

宮前公園内に新保育園舎を建設する。

老朽化が著しい旧小台橋小校舎内の現小台橋保育園（公設民営）を宮前公園内の新保育園舎に仮移転させる。

旧小台橋小校舎を解体・除却し、跡地に新小台橋保育園（民設民営）を整備し、仮移転中の小台橋保育園を移転する。

その後、宮前公園内の保育園舎には西尾久保育園を定員拡大させた上で移転し、現西尾久保育園は廃止する。

宮前公園内に新図書館を整備し、尾久図書館を移転する。

旧小台橋小校舎を利用している、あさがお福祉作業所及び多文化共生センターについては、一時仮移転の後、旧尾久図書館に移転する。

宮前公園周辺地域の地図



(仮称) 宮前公園先行整備工事

工事説明資料

荒川区 防災都市づくり部 道路公園課 建設係

株式会社後藤造園 荒川支店

1. 工事概要

工事件名 (仮称) 宮前公園先行整備工事

工事場所 東京都荒川区東尾久八丁目45番

工期 平成28年7月下旬から平成28年10月下旬まで
(5ページ「工程表」参照)


工事内容 公園整備工事
基盤整備、植栽、雨水排水設備、汚水排水設備、
電気設備、園路広場、サービス施設、管理施設、給水設備

工事概要 ダスト舗装：約2,700㎡
フェンス1(高さ1.8m)：約23m
フェンス2(高さ0.8m)：約30m
入口スロープ：1箇所 水飲み：1基 ベンチ：8基
照明灯：8基 散水栓：3箇所 制札板：1基
車止め：2基
その他(植栽、門扉、集水桝、汚水桝、点字ブロックなど)

問合せ先 受注者 株式会社後藤造園 荒川支店
荒川区町屋五丁目16番3号
電話 03-3894-9151
現場代理人(担当) 羽尾
連絡先 090-8809-6321
現場代理人は特別な事情がない限り、現場に常駐します。

発注者 荒川区
電話(代表) 03-3802-3111(内線) 2754
担当 防災都市づくり部道路公園課建設係 高橋

2. 計画平面図

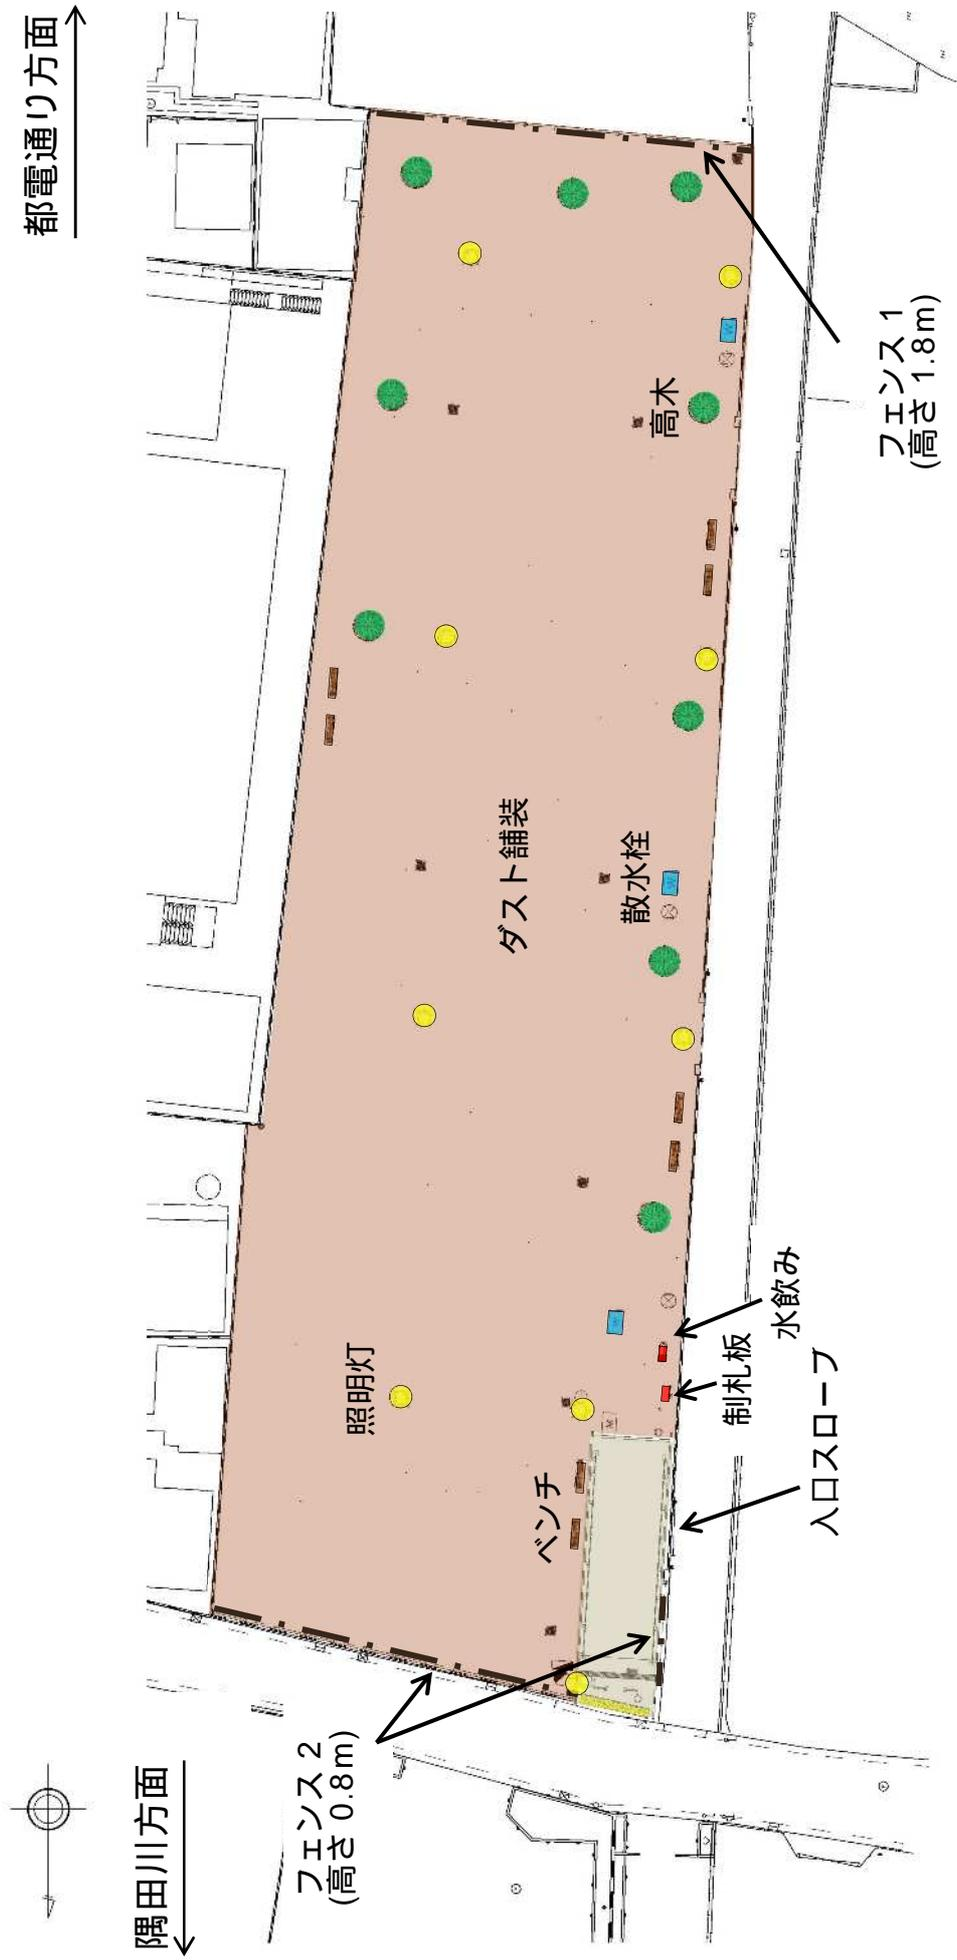

3 . 遵守事項

作業日 原則として、日曜日及び祝日は作業を行いません。
やむを得ず作業を行う場合には、事前に近隣の方にお知らせします。

作業時間 原則として、午前 8 時 3 0 分から午後 5 時 3 0 分までとします。
ただし、前後 1 時間は作業準備・積み込み作業・朝礼・点検・後片付け・清掃を行います。

作業日・作業時間とも、台風・地震等の緊急対策につきましては、上記以外に作業を行う場合があります。

搬入出路 大型車両は「大型車両通行ルート図」(6 ページ) のとおり通行します。

交通安全対策

- ・現場の搬入出口には交通誘導員を配置します。
- ・運搬車両通行時には、搬出入路上にも適宜交通誘導員を配置します。
- ・車両の運転手には安全運転を心がけるように指導徹底します。
- ・登校時の工事車両が識別できるよう、工事件名入りのステッカーをダッシュボード等に表示します。
(7 ページ「車載ステッカー」参照)

- 騒音振動対策
- ・できる限り騒音及び振動発生が少ない工法や重機を採用するとともに、慎重に作業するよう心がけます。
 - ・掘削機などの建設重機は、都の条例の基準に適合した低騒音、低振動タイプを採用します。
(7 ページ「基準適合ラベル」参照)

粉塵対策

粉塵等が予想できる場合には、散水を十分に行い、粉塵の飛散防止に努めます。

- その他
- ・工事現場の周囲には仮囲いを設け、工事関係者以外の方が現場敷地内に立ち入ることの無いよう管理し、事故防止に努めます。
 - ・周辺道路を汚さないよう、車両搬入出時にタイヤの洗浄を行います。
 - ・万が一、道路を汚損した場合は、清掃・復旧します。
 - ・工事車両は周辺道路には駐車しません。
 - ・火気の取扱には十分注意するとともに、休日中も含め、火災の防止に努めます。

近隣の皆様へのご迷惑を少なくするよう最善の努力をいたしますが、万が一問題が発生した場合には誠意をもって早急に対処いたします。

ご理解とご協力の程、よろしくお願ひいたします。

何かご不明な点がございましたら、担当者もしくは現場代理人までご連絡ください。

4. 工程表 (予定)

件名 月/日	(仮称)宮前公園先行整備工事												工期				
	7月			8月			9月			10月			(自) 平成28年 7月22日	(至) 平成28年10月19日			
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
準備工																	
基盤整備																	
公園土工																	
公園施設等撤去・移設工																	
植栽工																	
雨水排水設備																	
汚水排水設備																	
電気設備工																	
園路広場整備工																	
サービス施設整備工																	
管理施設整備工																	
道路整備工																	
機械設備工事																	
跡片付・清掃																	

上記工程表は予定ですので、変わる場合があります。

6. 基準適合ラベル・車載ステッカー

基準適合ラベル

工事車両の側面に貼付されています

【排出ガス対策型建設機械指定制度表示】

【オフロード法基準適合表示】



可搬式建設機械の表示

車両系建設機械の表示

基準適合表示

排出ガス基準に関する表示

騒音基準に関する表示

車載ステッカー

工事車両のダッシュボードに表示します。

(仮称) 宮前公園先行整備工事

工事車両

管理番号 No.1

株式会社後藤造園 荒川支店

工事車両用ステッカー (表面)

工事車両用ステッカー (裏面)

(仮称) 宮前公園先行整備工事 現場入場車両の注意事項

当現場周辺での待機場所はありません。
現場内では、決められた場所に駐車すること。
アイドリング状態での駐・停車は厳禁。必ずエンジン停止すること。
歩行者及び自転車は最優先すること。特に登下校時の中学校の生徒に対し、特に注意すること。
当現場入場・決められた場所に駐車の際、必ずダッシュボードの目立つ部分に掲示すること。

担当部署連絡先一覧

問合せ内容	課名	内線
公共施設の順次更新に関する事	総務企画課	2 1 1 1
宮前公園の整備に関する事	道路公園課	2 7 5 4
小台橋・西尾久保育園に関する事	保育課	3 8 2 1
尾久図書館に関する事	図書館課	4 3 6
あさがお福祉作業所に関する事	障害者福祉課	2 6 8 1
多文化共生センターに関する事	子育て支援課	3 8 1 1
あらかわ遊園に関する事	荒川遊園課	4 7 3
旧小台橋小学校内体育施設の利用に関する事	教育施設課	3 3 2 1

区役所代表番号（03 - 3802 - 3111）にお掛けの上、
該当する内線番号をお伝えください。
